
МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

ПдСх / головна стіна та верхній пояс

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

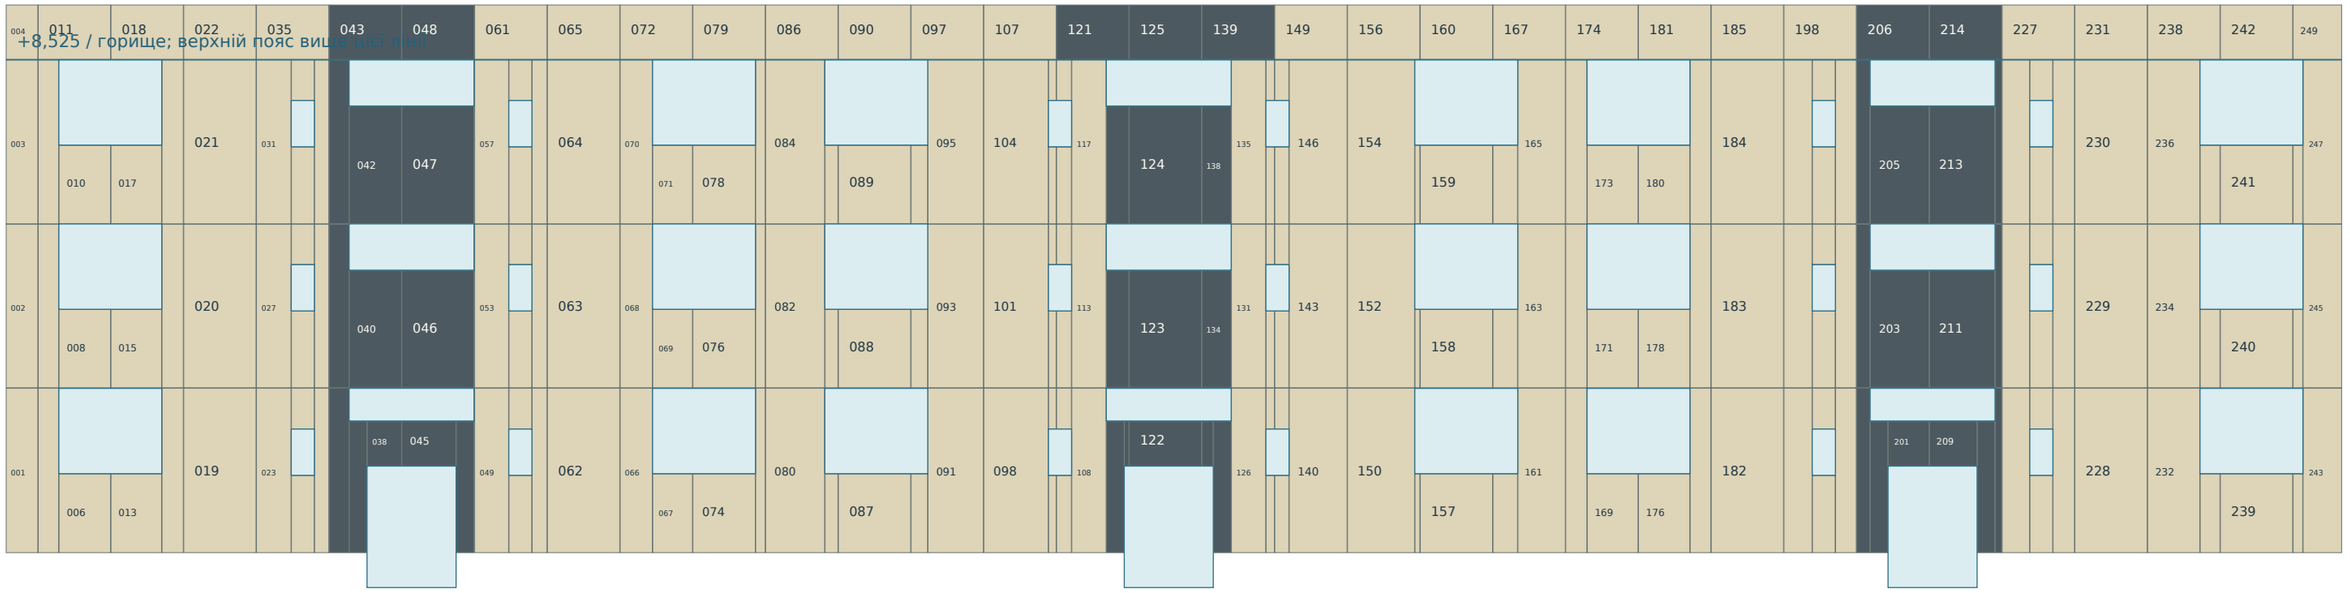

40400 мм / зовнішній фасадний вид

Верх облицювання: 9475 мм / графічний кандидат під дахом

ДЕТАЛІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ / не різати за цим листом

SE-112 / заготовка 76×772 мм / x 19345, y 1504

SE-103 / заготовка 129×695 мм / x 18034, y 4986

SE-106 / заготовка 129×697 мм / x 18034, y 7824

SE-100 / заготовка 129×702 мм / x 18034, y 2144

SE-133 / заготовка 142×695 мм / x 21795, y 4986

SE-137 / заготовка 142×697 мм / x 21795, y 7824

SE-128 / заготовка 142×702 мм / x 21795, y 2144

VS-2 / номінальна товщина нових шарів



100 + 50 + 50 + 9 + 25 + 8 = 242 мм / без стіни та стрічок

Кількість і положення анкерів не задані.

Варіанти цієї площини. Залишки між фасадами не об’єднані.

A / модуль 840 / зсув 623 мм 318 деталей 0 перевірити 98 листів використання 80.99%

B / модуль 1200 / зсув 1033 мм 244 деталей 0 перевірити 98 листів використання 85.20%

C / модуль 1258 / зсув 555 мм 249 деталей 0 перевірити 94 листів використання 84.72%

A: рейки 420 мм. B/C змінюють сітку і потребують узгодження. Помаранчеве — перевірити.


Без цоколя, відкосів, площин тамбурів і балконних огороджень. Не прирівнювати площу до договірних 955 м².

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

ПнЗх / головна стіна та верхній пояс

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

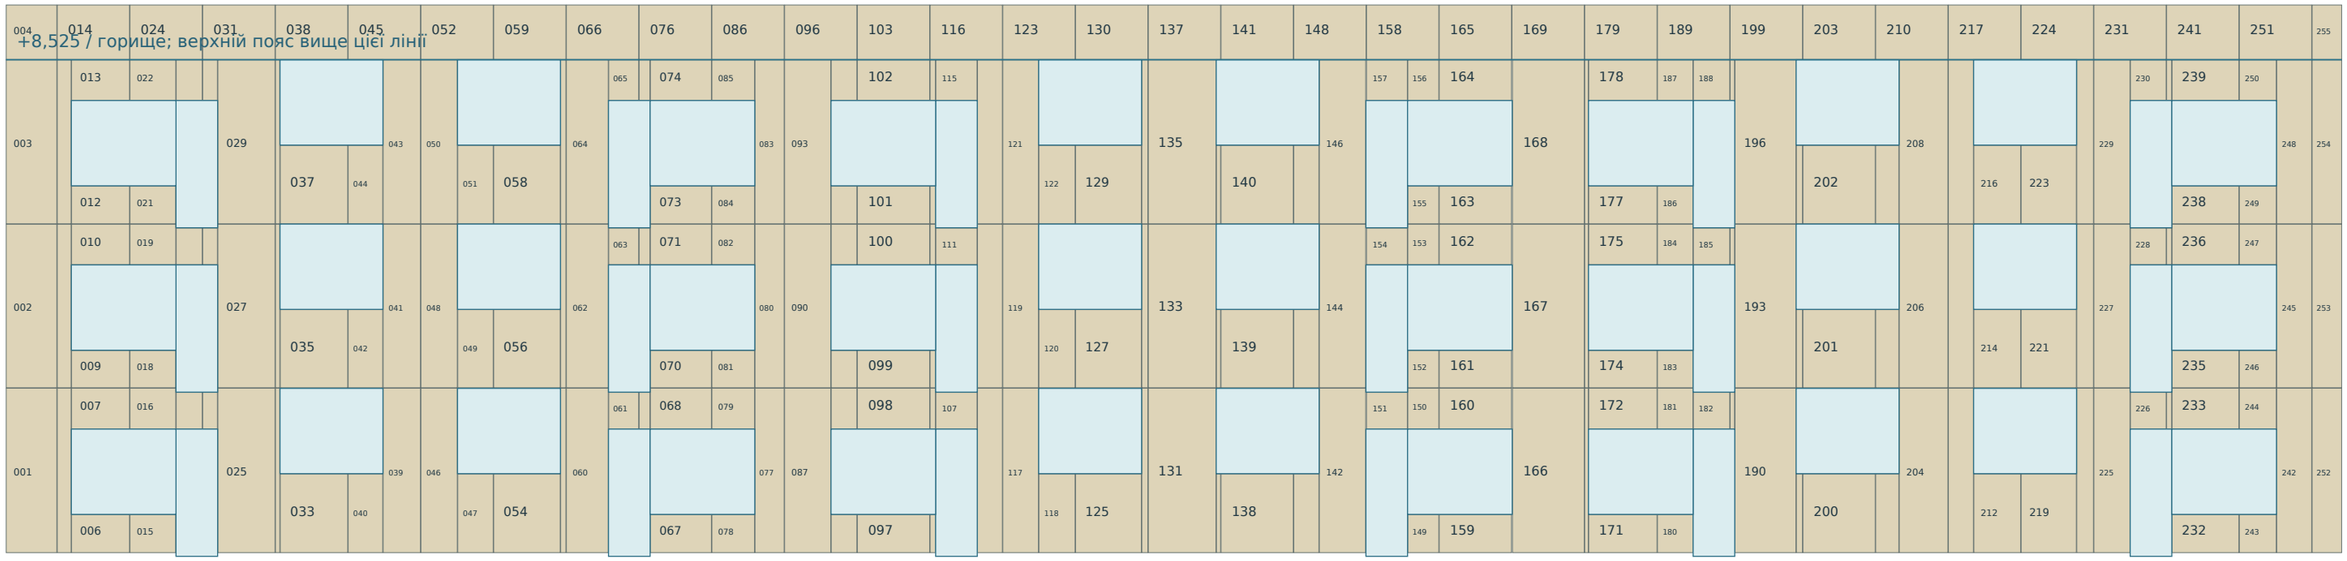

40400 мм / зовнішній фасадний вид

Верх облицювання: 9475 мм / графічний кандидат під дахом

ДЕТАЛІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ / не різати за цим листом

NW-191 / заготовка 75×630 мм / x 29821, y 2144

NW-194 / заготовка 75×634 мм / x 29821, y 4982

NW-197 / заготовка 75×697 мм / x 29821, y 7824

NW-234 / заготовка 86×630 мм / x 37369, y 2144

NW-237 / заготовка 86×634 мм / x 37369, y 4982

NW-108 / заготовка 92×645 мм / x 15983, y 2854

NW-240 / заготовка 86×697 мм / x 37369, y 7824

VS-2 / номінальна товщина нових шарів



100 + 50 + 50 + 9 + 25 + 8 = 242 мм / без стіни та стрічок

Кількість і положення анкерів не задані.

Варіанти цієї площини. Залишки між фасадами не об’єднані.

A / модуль 840 / зсув 429 мм 334 деталей 0 перевірити 89 листів використання 74.80%

B / модуль 1200 / зсув 1198 мм 265 деталей 0 перевірити 87 листів використання 80.50%

C / модуль 1258 / зсув 883 мм 255 деталей 0 перевірити 81 листів використання 82.45%

A: рейки 420 мм. B/C змінюють сітку і потребують узгодження. Помаранчеве — перевірити.


Без цоколя, відкосів, площин тамбурів і балконних огороджень. Не прирівнювати площу до договірних 955 м².

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

ПдЗх / прямокутна частина торця до горища

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

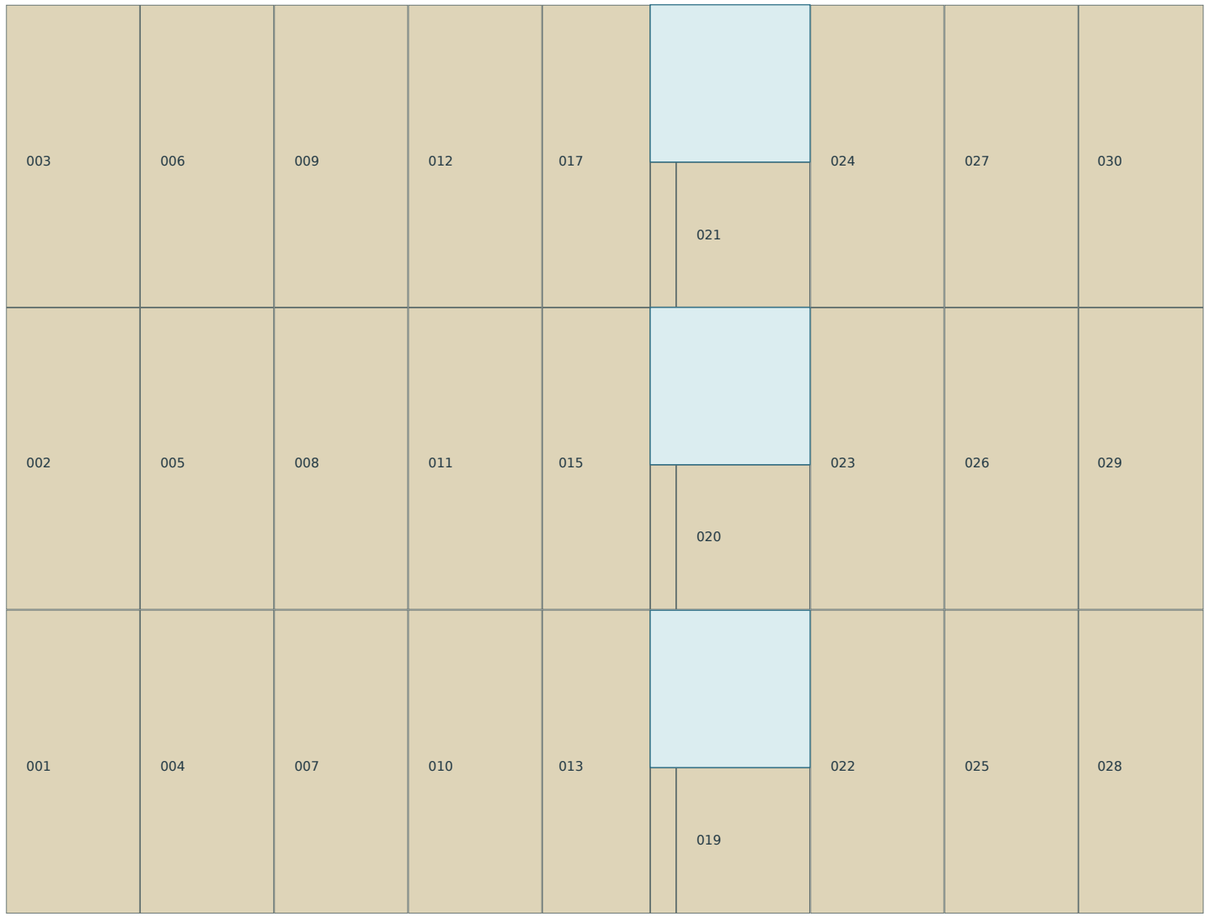

11240 мм / зовнішній фасадний вид

Варіанти цієї площини. Залишки між фасадами не об’єднані.

A / модуль 840 / зсув 818 мм 45 деталей 0 перевірити 36 листів використання 64.06%

B / модуль 1200 / зсув 820 мм 36 деталей 0 перевірити 30 листів використання 80.83%

C / модуль 1258 / зсув 1248 мм 30 деталей 0 перевірити 26 листів використання 89.04%

A: рейки 420 мм. B/C змінюють сітку і потребують узгодження. Помаранчеве — перевірити.


Без цоколя, відкосів, площин тамбурів і балконних огороджень. Не прирівнювати площу до договірних 955 м².

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

ПнСх / прямокутна частина торця до горища

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

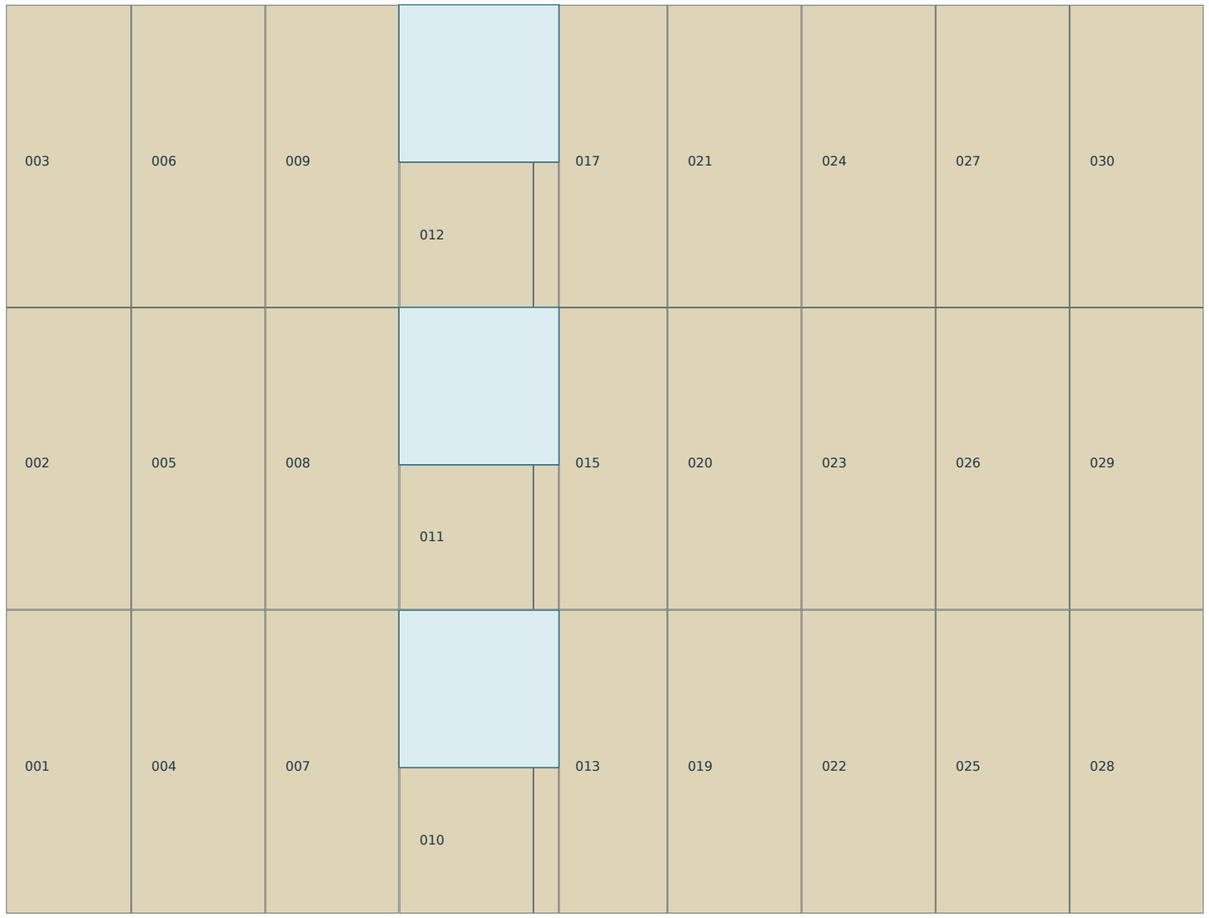

11240 мм / зовнішній фасадний вид

Варіанти цієї площини. Залишки між фасадами не об’єднані.

A / модуль 840 / зсув 337 мм 45 деталей 0 перевірити 36 листів використання 64.06%

B / модуль 1200 / зсув 820 мм 36 деталей 0 перевірити 30 листів використання 80.83%

C / модуль 1258 / зсув 1181 мм 30 деталей 0 перевірити 26 листів використання 89.04%

A: рейки 420 мм. B/C змінюють сітку і потребують узгодження. Помаранчеве — перевірити.


Без цоколя, відкосів, площин тамбурів і балконних огороджень. Не прирівнювати площу до договірних 955 м².

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

ПдЗх / верхній пояс і профільовані заготовки

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

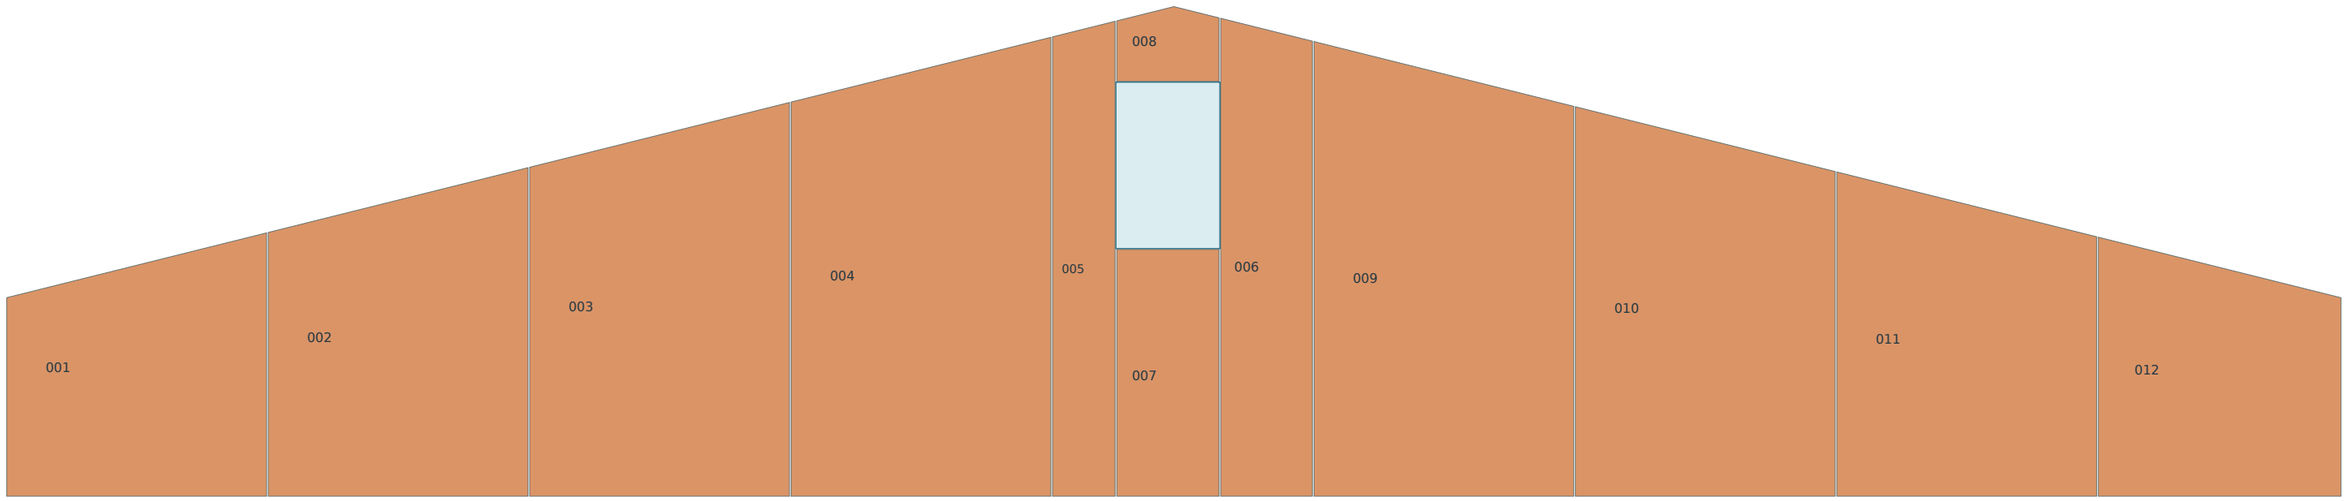

11240 мм / зовнішній фасадний вид

ДЕТАЛІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ / не різати за цим листом

SWG-008 / заготовка 492×360 мм / x 5345, y 1999

SWG-007 / заготовка 492×1187 мм / x 5345, y 4

SWG-005 / заготовка 301×2285 мм / x 5036, y 4

SWG-006 / заготовка 441×2299 мм / x 5845, y 4

SWG-012 / заготовка 1168×1246 мм / x 10068, y 4

SWG-001 / заготовка 1250×1267 мм / x 4, y 4

SWG-011 / заготовка 1250×1560 мм / x 8810, y 4

VS-2 / номінальна товщина нових шарів



100 + 50 + 50 + 9 + 25 + 8 = 242 мм / без стіни та стрічок

Кількість і положення анкерів не задані.

12 профілів / готова площа 18.04 м² / заготовки 19.63 м²

Від горища +8,525: вертикальний пояс і два схили. Гільйотинний розкрій дає заготовки; скіс — додаткова операція.

Контур під повним кандидатним пакетом даху 214,8 мм по нормалі + 4 мм. Існуюча кроква 150 мм не обміряна; вузол примикання та вентрешітку звірити.

A: рейки 420 мм. B/C змінюють сітку і потребують узгодження. Помаранчеве — перевірити.


Без цоколя, відкосів, площин тамбурів і балконних огороджень. Не прирівнювати площу до договірних 955 м².

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

ПнСх / верхній пояс і профільовані заготовки

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

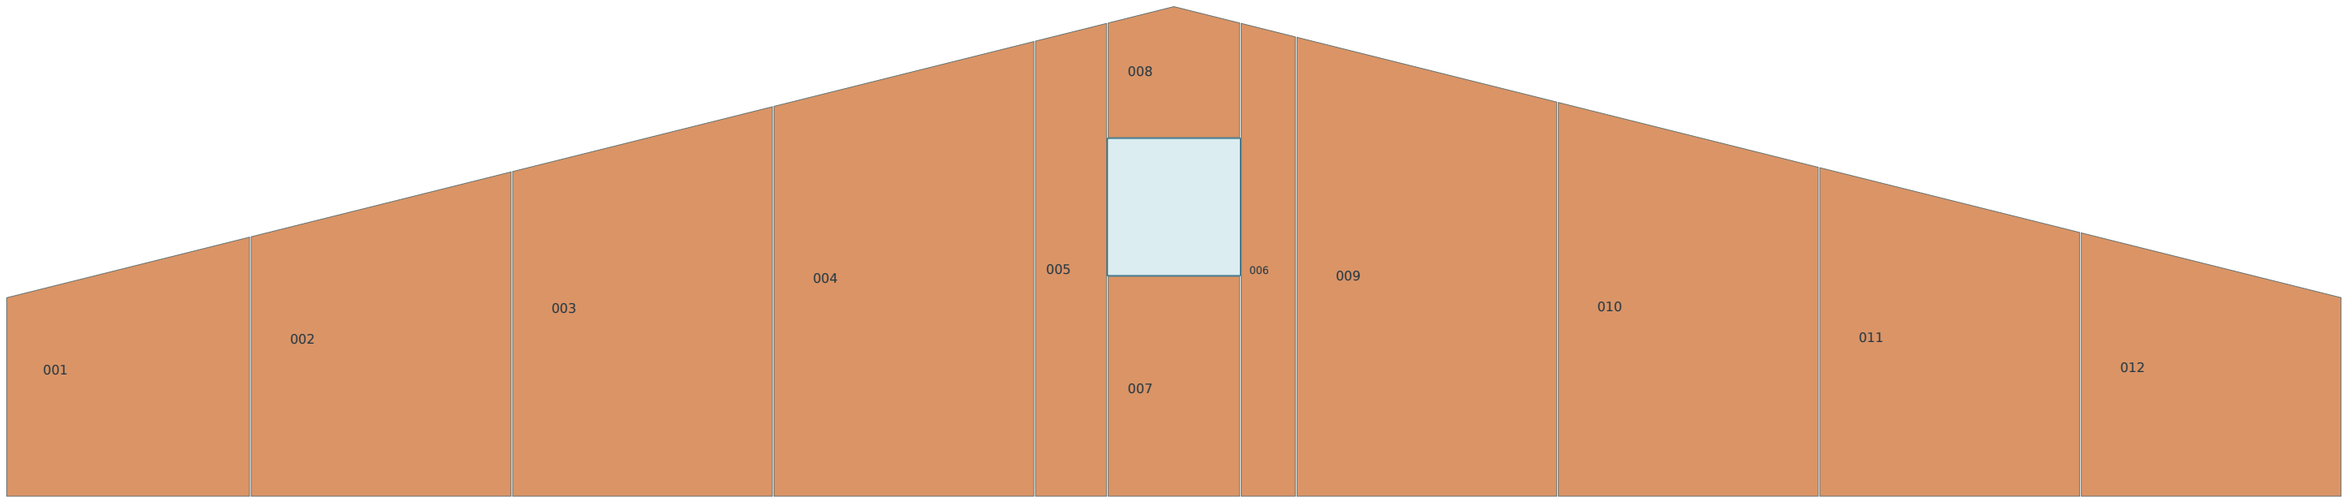

11240 мм / зовнішній фасадний вид

ДЕТАЛІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ / не різати за цим листом

NEG-008 / заготовка 632×630 мм / x 5304, y 1729

NEG-006 / заготовка 260×2274 мм / x 5944, y 4

NEG-007 / заготовка 632×1057 мм / x 5304, y 4

NEG-005 / заготовка 342×2274 мм / x 4954, y 4

NEG-001 / заготовка 1168×1246 мм / x 4, y 4

NEG-012 / заготовка 1250×1267 мм / x 9986, y 4

NEG-002 / заготовка 1250×1560 мм / x 1180, y 4

VS-2 / номінальна товщина нових шарів



100 + 50 + 50 + 9 + 25 + 8 = 242 мм / без стіни та стрічок

Кількість і положення анкерів не задані.

12 профілів / готова площа 18.02 м² / заготовки 19.60 м²

Від горища +8,525: вертикальний пояс і два схили. Гільйотинний розкрій дає заготовки; скіс — додаткова операція.

Контур під повним кандидатним пакетом даху 214,8 мм по нормалі + 4 мм. Існуюча кроква 150 мм не обміряна; вузол примикання та вентрешітку звірити.

A: рейки 420 мм. B/C змінюють сітку і потребують узгодження. Помаранчеве — перевірити.


Без цоколя, відкосів, площин тамбурів і балконних огороджень. Не прирівнювати площу до договірних 955 м².

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

Дах / поперечний розріз кандидата PP-1, PDF55

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

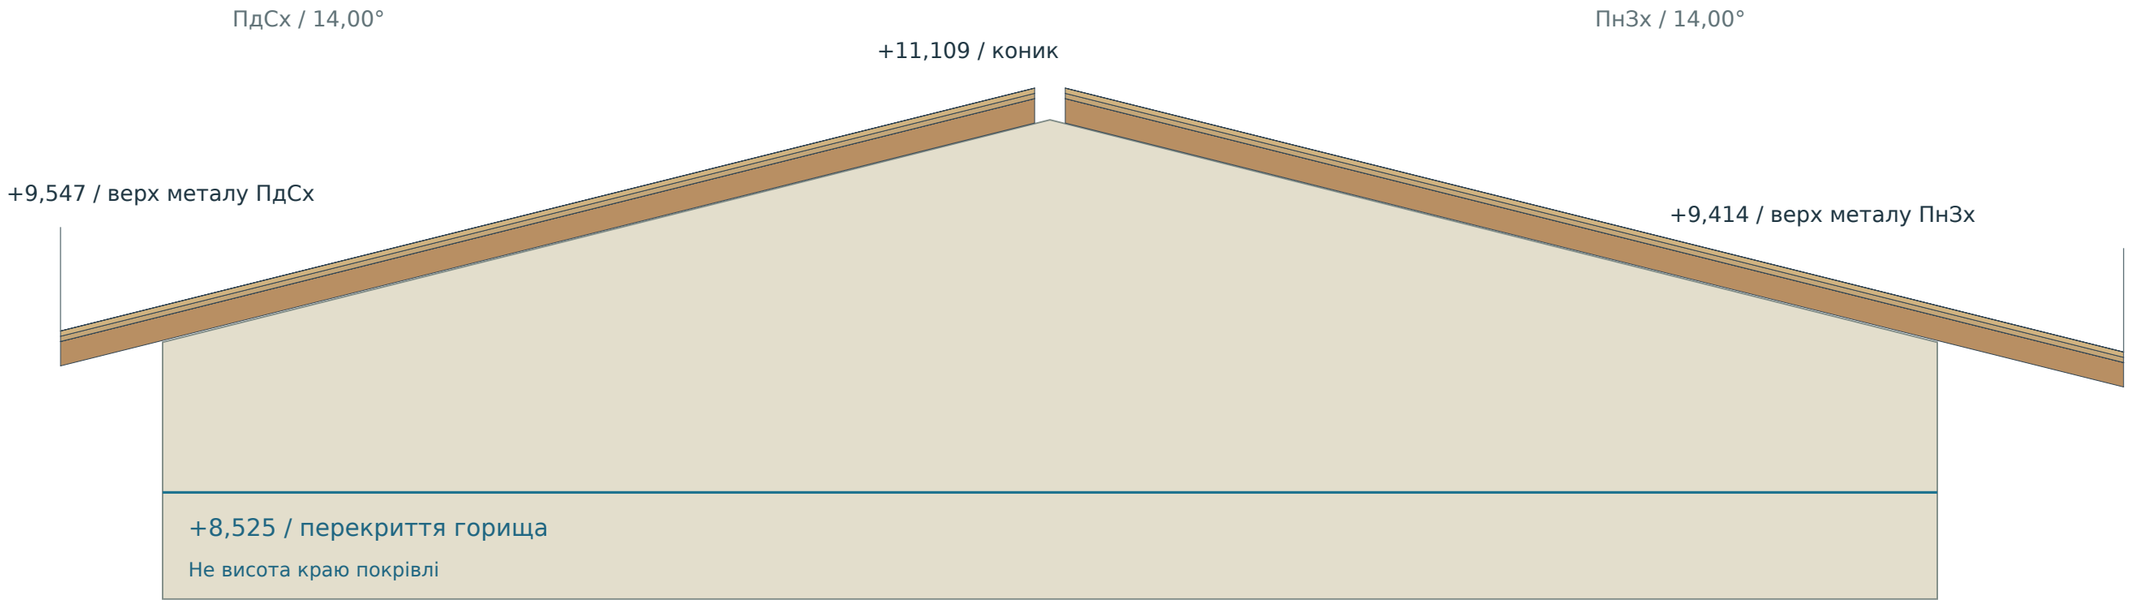

Звиси від поточної фасадної площини ±5,62: ≈647 мм спереду / ≈1180 мм ззаду.

§5.4: мінімум 600 / 750 мм від утепленої стіни. Торцеві 300 мм — подовження; не доведений загальний звис.

Довжина ≈41,600 м і торцевий звис ≈600 мм графічно з PDF53. Потрібен написаний робочий розмір.

ГРАФІЧНИЙ КАНДИДАТ / МЕЖІ ДЖЕРЕЛА

Вибір: верхній контур PDF55, прив’язаний до письмового коника +11,109. Це не обмір і не погоджений вузол.

PDF54 дає більші півширини: приблизно +140 мм спереду / +256 мм ззаду. Задній фасад містить коник +11,149.

Нижні фасції PDF53 ≈9,230 / 9,068 — інші грані, не верх металу. Робоча глибина короба та посадка не підтверджені.

Пакет 214,8 мм: кроква 150 (кандидат) + мембрана 0,2 (показова) + контрлата 32 + лата 32 + метал 0,6. Смуги є огинаючими шарів; дерево дискретне. Деталь на наступному аркуші.

Верх SE облицювання 9475 мм при зовнішній грані z=5,649 м: кандидатний обріз під повним пакетом; це не обмір стіни чи розрахунок опирання.

Графічні суперечності: RFI-07. Профіль, крокви, торцеві зарізи й маршрути мембрани: RFI-11 / roof-source.json.

Чиста форма макета не замінює уточнення проєктанта. Горище, метал і нижня фасція мають окремі рівні.

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

Дах / п’ять шарів і тонкостінний профіль / кандидат v09

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

PDF60 / вузол 12 / §5.4: контрлата 32×50 → лата 32×100 → Classic/PURAL 0,6

Профіль 475 / висота 32 / лати ≤200: офіційний довідковий Ruukki Classic Design475; замовлений виріб невідомий.



0,6 мм / метал

Проєктний матеріал; площина панелі 0,0 мм, фальц +32 мм.

32×100 / лата

Переріз у джерелі; крок ≤200 мм лише довідковий кандидат.

32×50 / контрлата

Переріз у джерелі; робочі стики й кріплення не призначено.

0,2 мм / мембрана

Не дихаюча в джерелі; товщина 0,2 мм лише для показу.

65×150 / кроква

Існуюча у джерелі; переріз і крок 1000 мм тут кандидати.

Опори показані в їхньому перетині; дерево не заповнює весь дах. Мембрана має показову фізичну товщину.

ПОПЕРЕЧНИЙ ПРОФІЛЬ / не виробничий шаблон замка

Стінки 0,6 мм, модуль 475 мм і висота 32 мм; ідеалізований U-повернений край 6,6 мм. Його ширина, радіуси згину, защіпка й водозахисний замок не встановлені джерелом. Не гнути й не замовляти за цим контуром.

Фрагмент 4×2,6 м на ПдСх скаті є точним перетином глобальних деталей: фаза й IDs профілів спільні з цілим дахом. Реальні кандидатні отвори KLK01 800×600 і вертикальні проходки вирізані в усіх п’яти шарах.

Кандидатні кінці: 100 мм відступ біля коника, тонкий ковпак 0,6 мм з підняттям 40 мм; дерево вертикально підрізане до задньої грані фасції 22 мм. Показова мембрана там завершена; фактичний маршрут і крапельник невідомі.

450 мм утеплення належить перекриттю горища +8,525, а не похилому пакету. Софіт 22×100 / щілина 15 мм за §5.4.

Редагований CAD профілю — геометричний кандидат. Див. RFI-11; міцність, кріплення, монтаж і замовлення не схвалені.

https://www.ruukki.com/est/katusetooted/tooted-ja-teenused/katuseprofiilid/katuse-detailid/parnu-classic-design-c-475mm


ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10


Cembrit / відкоси вікна / польовий варіант

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

2 бокові + 2 верхні деталі / шов FC-FC 8 мм / глибина до рами 150 мм

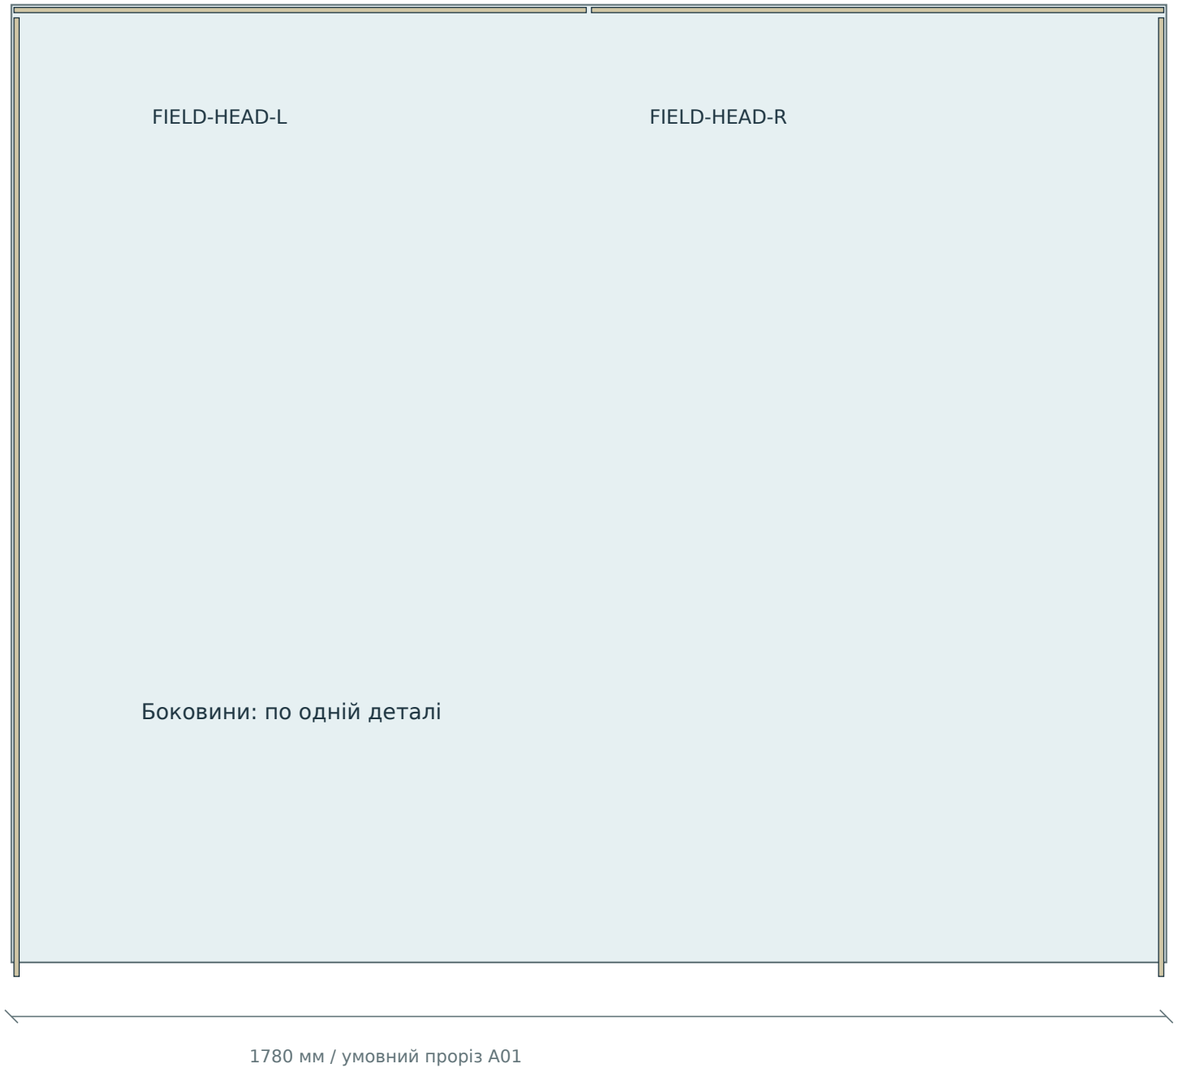

БОКОВИНА / ПРОФІЛЬ Y-Z



ВЕРХНЯ ДЕТАЛЬ / 2 ШТ.



Готова: 882 × 148 × 8 мм

ЗАГОТОВКИ / ДО УТОЧНЕННЯ

Боковини: 1477 × 150 × 8 мм / 2 шт.

Верх: 882 × 150 × 8 мм / 2 шт.

Пропил і запас на край не задані.

Це розміри мінімальних прямокутних заготовок, не підтвердження формату замовлених листів.

Нижній заріз: 10° / за лінією відливу

150 мм до рами = 148 мм готової деталі + показовий задній зазор 2 мм.

FC-FC: 8 мм. FC-відлив: 2 мм вертикально, показовий зазор. Схему двох верхніх деталей ще звіряємо.

Публічний арк.14 показує PURAL0,6 мм; цей Cembrit-вузол походить з опису автора завдання. RFI-09 відкритий.

Приховані опори, кріплення, герметизацію, відведення води й пожежне рішення не погоджено.


ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

Вхід / навіс: сталевий клин і реальні шари / PDF68, PDF70

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

Поздовжній переріз / 15° / горизонтальний низ сталевого каркаса

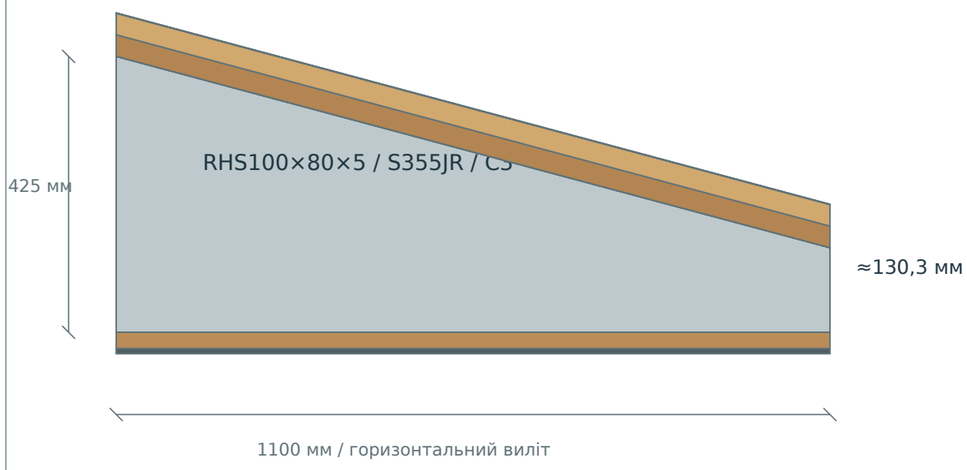


425 − 1100·tan15° = 130,3 мм / габарит клина, не затверджена довжина деталі

Прив’язка: верх біля стіни 2,042992 м / графіка 1,955863 м

Різниця +87,13 мм / просвіт дверей 18 мм — лише кандидат


Передня нижня поперечина: відступ103,156 мм — кандидат, не заданий у джерелі.

План каркаса / 2660×1100 мм / номінал джерела

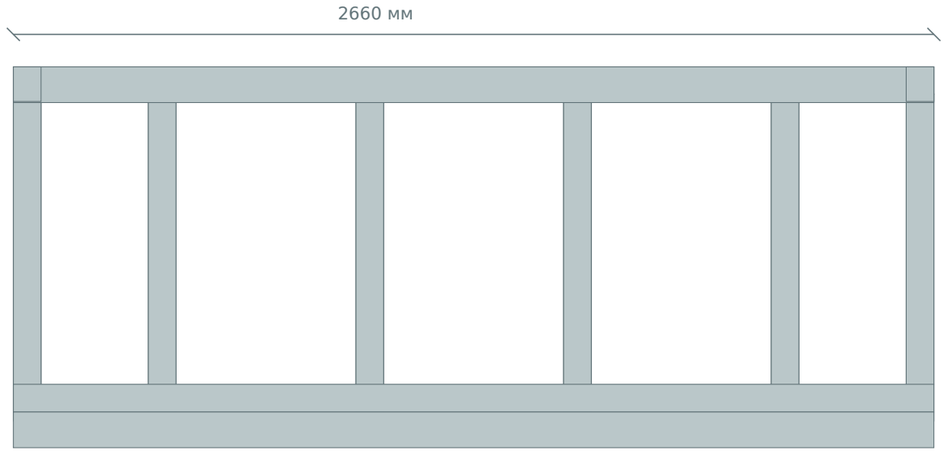

ВЕРХ: метал0,6 / лати32×100 / контрлати32×50

Підкладка: тип з джерела; товщина0,2 мм лише показова.



RHS / стінка5 мм

НИЗ: брус25×100 / підшив FC8 / шов8 мм — кандидат

Опори підшиву: 375,71 мм — кандидат≤400 мм

Проєкт420 / SwisspearlDIM ceiling400 max → RFI-10.

У FreeCAD: кільцеві ескізи, Pad і відсічні Pocket. Радіуси, шви, отвори, анкери, робочі зарізи та кінцеві кріплення не підтверджені.

Задні стійки:225 мм джерело / 194,68–221,47 мм кандидат

1055 мм на арк.22 збережено як номінал джерела; кандидатні довжини й зарізи потребують робочого креслення.

Кількість входів:3 з проєкту. Геометрія та прив’язки кожного ще потребують окремого обміру.

Зовнішні VU01 / «нового тамбура не буде» та SBS / Classic залишаються відкритими: RFI-06, RFI-02.

Переріз показує склад системи; не задає погоджену схему зварювання, кріплення чи допусків.

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10


VS-1 / цоколь: план, розріз і межі кількостей / PDF57, PDF58

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

183 мм нових шарів: EPS 100 + EPS 50 / брус 50 + профіль/повітря 25 + FC 8. Існуюча основа не входить у суму.

50×75 / крок 600 і горизонтальний профіль 25 / крок 420 - джерело. Висота 660 мм, переріз профілю й розкладка - кандидати.

ПЛАН / фрагмент SE / x=6.800…9.200 м

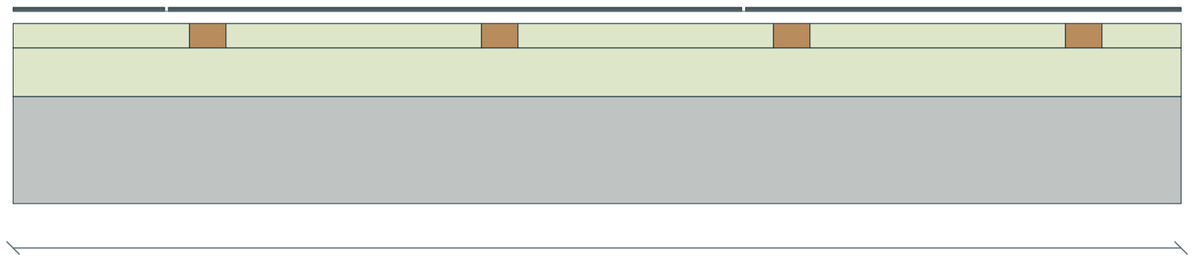


Брус має 75 мм опорну грань; EPS 50 доповнює комірку без подвійного об’єму.

Шов FC-FC 8 мм; панелі ≤1192 мм збалансовані. Цілих кандидатних FC: 88.

На фрагменті: VS1-SE-FC-023, VS1-SE-FC-024, VS1-SE-FC-025. IDs спільні з цілим цоколем; обрізка не створює нових заготовок.

456 фізичних деталей / 17 проєкцій огляду; отвори підвалу й тонка зона не призначені.

ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗРІЗ / через опору

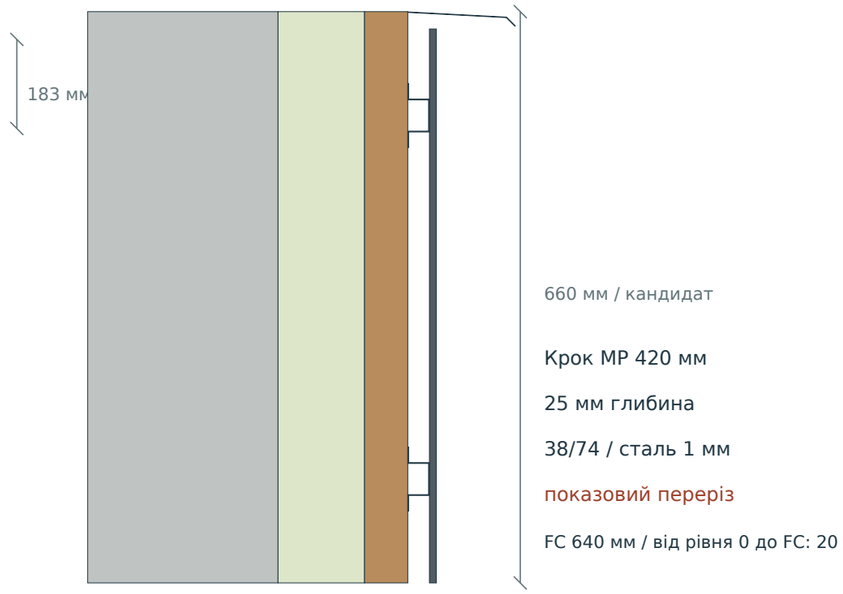

Відступ FC: 59 мм номінал / 61 мм модель зі стрічкою-кандидатом.

ДЖЕРЕЛЬНІ ОБСЯГИ / Hanketabel74–76

EPS150	71 м²	71 м² + 5 м² не визначають місце тоншої ділянки.
EPS50 / тонка зона	5 м²	76 м² є джерельним рядком; не підганяти модель під це число.
FC / P070	76 м²	FC геометрії ≈65,464 м² / висота 640, шви 8; отвори відсутні,

ОБ’ЄМИ КАНДИДАТА

EPS: 180 деталей / 9,6881 м³

Дерево: 172 деталей / 0,4257 м³

MP: 8 деталей / 0,0248 м³

PURAL: 4 деталей / 0,0078 м³

ВУЗОЛ І НЕВИРІШЕНІ МЕЖІ / RFI-12

PDF58: видимий капельник PURAL 0,6 - кандидат форми. Перехід 50×175, RKL31/аналог 30, стрічка й сітка не розміщені: робочий вузол невідомий. Відмостка 600 мм/2%; зазор 20 мм до FC проти довідкових 50 мм виробника потребує погодження.

Горизонтальний профіль локально перекриває 25 мм глибини: безперервність повітря й дренаж не доведені. Полиці 38/74, сталь 1 мм, висота 660, кути 45° і підкладена стрічка - кандидати; замовлений MP25/38 невідомий.

Історичний U=0,271 для EPS 100 не застосований. Основа/анкери, кутовий 50×100, отвори, межі 5 м² і фундамент до підошви потребують обміру/робочого вузла. Нижче землі модель не продовжена.

Геометричні об’єми та кількість деталей не є закупівельною відомістю або погодженим монтажним вузлом.

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

Реєстр питань до компанії / проєктанта

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

RFI-01 / RKL31: проклеювання і товщина

Проєкт: Арк.20/PDF68: Mineraalvill150mm, ntIsoverRKL31, liitekohadteipida; локально RKL31 30mm

Виробник: ISOVER RKL31: не проклеювати; стрічка може відпасти й перекрити вентиляцію. На поточній сторінці товщини25–100мм.

Питання: Яка фактична плита150мм/30мм? Який затверджений спосіб герметизації саме цих стиків і примикань? Чи потрібна виправлена ревізія20?

Стан: Відкрите; відповідь проєктанта/компанії

RFI-02 / SBS проти Classic

Проєкт: Арк.05/06: TuulekojakatuseksSBS. Арк.20: Classic0,6PURAL, не дихаюча підкладка, 32×50/32×100, сталь100×80×5, нахил15°.

Питання: Яке рішення козирка чинне? Надати погоджений вузол кріплення, водовідведення і примикання, точний профіль покриття.

Стан: Відкрите; не обирати покриття самовільно

RFI-03 / Геометрія тамбура й головної стіни

Проєкт: Арк.05:2720мм. Арк.20:2730мм, глибина1345мм. VU01:2305×2100мм,1015+1290. Проріз головної стіни за тамбуром не підтверджено.

Питання: Обміряти зовнішні площини, прохід за тамбуром, верх дверей/козирка/сходового вікна. Погодити висоти та виключення перекритих площ у розкладці.

Стан: Відкрите; 32мм смуги не різати

RFI-04 / 955м² і правила обміру

Проєкт: Hanketabel92:955м² вітрогіпс/рейки/облицювання;76м² цоколь окремо. Чотири прямокутні стіни в моделі рахуються з відніманням прорізів; балкони, тамбури й фронтони — окремо.

Питання: 955м² є брутто, нетто чи договірною площею? Що входить у ряд92? Як окремо оплачуються відкоси, рамки, балкони, тамбури й дах?

Стан: Відкрите; не прирівнювати до чистих оплачуваних м²

RFI-05 / Навантаження і підконструкція

Проєкт: VS2:0,5кН/м², щонайменше5 pull-out tests, кронштейн150×150×60×2,5; брус600, рейки420. §5.1 задає базову швидкість вітру21м/с, але цього недостатньо для визначення тиску й крайових зон.

Виробник: Swisspearl: крок/кріплення від вітру, крайові відстані, фіксовані/ковзні точки, опори швів і вентиляція.

Питання: Надати робочу схему анкеровки/крайових зон/локальних опор, результати випробувань, точну модель плит/кріплень/пожежні вузли. Узгодити будь-яку зміну420.

Стан: Відкрите; сітка економії не є розрахунком міцності

RFI-06 / Вхід: новий тамбур чи відкритий навіс

Проєкт: Записка§1.1.1: старі тамбури знести, нового не будувати; нові бокові стіни та навіс. Арк20: VU01 у зовнішній площині, підлога tuulekoda, глибина1345мм.

Питання: Погодити чинну форму входу та місце VU01. Чи арк20 показує інший варіант? Які площини облицювання й засклення залишаються?

Стан: Відкрите; 3D входу показує непогоджений варіант арк20

Перед серією: точна марка матеріалів, погоджений вузол, випробування основи та приймання прихованих робіт.

Усі наведені RFI відкриті. Див. rfi-register.json для посилань і поточного стану.

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

Реєстр питань до компанії / проєктанта / продовження 2

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

RFI-07 / Дах: висота країв, звиси й узгодження графіки

Проєкт: +8,525 — перекриття горища; коник +11,109. Розріз PP-1 дає графічний ухил≈14° і півширини6,267/6,800м. Фасад06 і розріз07 різняться по краях; 300мм означає подовження, а не доведений загальний звис.

Питання: Надати чинний розріз з написаними позначками металу, підшивки й країв, фактичними звисами від утепленої стіни та торців. Звірити верхню смугу фасаду і площу покрівлі.

Стан: Відкрите; 3D відновлено за графікою PP-1, не за обміром

RFI-08 / Балкон: закрита боковина й дзеркальність

Проєкт: Вузол17: одна боковина суцільний FC, інша FC + скло. Прив’язка сторін виведена з планів02/03 і фасаду05; козирок4+4мм і приховані опори потребують звірки.

Питання: Підтвердити боковину для кожного з18балконів, робочі габарити, висоту FC, шви, кріплення та опори скління/козирка.

Стан: Відкрите; мапа сторін — обґрунтований візуальний кандидат

RFI-09 / Відкоси Cembrit: опис бригади та чинний вузол

Проєкт: Арк14: PURAL0,6 мм. Автор завдання: Cembrit8, глибина≈150 мм, дві бокові й дві верхні деталі, FC-шви8 мм; металевий відлив.

Питання: Звірити матеріал відкосів, посадку рами, розташування двох верхніх деталей, зазори до PVC/відливу, опори, кріплення та водозахист.

Стан: Відкрите; окремий польовий кандидат, обміри не підтверджені

RFI-10 / Навіс: сталевий клин, висотна прив’язка й крок підшиву

Проєкт: Арк22/PDF70: RHS100×80×5 S355JR/C3,2660×1100, зад425,15°, номінал1055. Арк20: нижній брус25×100,420мм,FC8; верх32×50/32×100,Classic0,6.

Виробник: SwisspearlDIM p16:ceiling maximum400mm centres.

Питання: Підтвердити абсолютні відмітки дверей/клина/металу, кінці розміру425, робочі зарізи/опори/шви/анкери та крок підшиву. Презентаційний верх піднято≈87мм проти графіки;18мм просвіту та375,7мм підшиву є кандидатами. Дві задні стійки й передній відступ103,156мм — кандидати; джерельні225мм відрізняються від фактичного профілю194,68–221,47мм.

Стан: Відкрите; придатність до виготовлення й монтажу не підтверджена

RFI-11 / Дах: реальний пакет, профіль, торцеві зарізи й мембрана

Проєкт: PDF60/node12 і §5.4: існуюча кроква, не дихаюча підкладка, контрлата 32×50, лата 32×100, Classic/PURAL 0,6 мм. Переріз/крок існуючих крокв і товщина мембрани не задані. 450 мм утеплення - перекриття горища, не скат.

Виробник: Ruukki EE Classic Design475: довідкові 0,6 мм, корисний модуль 475 мм, висота 32 мм, рекомендований крок лат 200 мм. Це кандидат; замовлений виробник і точна защіпка невідомі.

Питання: Підтвердити виріб/замок/радіуси, крокви й опирання, крок лат, вентиляцію/коник, зарізи та маршрут мембрани/крапельник. Пакет 214,8 мм, кроква 65×150 / крок 1000, мембрана 0,2, край профілю 6,6, відступ коника 100 / підняття 40 мм, підрізи до фасції та отвори проходок - непогоджені кандидати. Верх FC 9475 мм на z=5,649 м є обрізом макета під пакетом, не обміром. Редагований CAD доводить геометрію, не дозвіл виготовлення.

Стан: Відкрите; робочий вузол, міцність, кріплення, виготовлення і монтаж не схвалені

Перед серією: точна марка матеріалів, погоджений вузол, випробування основи та приймання прихованих робіт.

Усі наведені RFI відкриті. Див. rfi-register.json для посилань і поточного стану.

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.

МÄЕ TN 7 · ALU / ВІДОМОСТІ ДЛЯ ЗВІРКИ · v10

Реєстр питань до компанії / проєктанта / продовження 3

P-8/8/22 PP v04 · 16.02.2026 / геометрія PDF + специфікація; чинність у компанії не підтверджена

RFI-12 / VS-1: цоколь, відмостка й перехід до VS-2

Проєкт: PDF57/node09 і §5.3: EPS120 Perimeeter 100+50, брус 50×75 @600, MP25/38 або аналог 25 @420, FC8 P070 — 183 мм. PDF58/node10: PURAL 0,6, водоніс, 50×175, RKL31/аналог 30, піна/стрічка/сітка, локальні 20 мм. §5.2: відмостка 600 / ≥2% / щебінь 200 / шви 2 м. Hanketabel74–76: 71 м² EPS150 + 5 м² EPS50 + 76 м² FC; тонка зона не локалізована. Старий PDF43 VS1 EPS100/U0,271 не прийнято як тепловий розрахунок нового пакета.

Виробник: Попередня перевірка Swisspearl DIM дала50мм над дренованою поверхнею; застосовність до конкретного цокольного виробу й горизонтальної металевої підконструкції потребує узгодження. MP25/38 у проєкті не задає повної геометрії перерізу чи товщини сталі.

Питання: Звірити ревізію й обмір: змінна висота, отвори, ґрунт, 5 м² тонкої зони та підошва. Погодити 20 мм проєкту проти вимоги виробника, вентиляційний і водний шлях через горизонтальні профілі, кріплення FC до металу, кути 50×100/профіль, перехід 50×175/RKL31/стрічки/сітка та нижні продухи. Макет: пакет 660 мм / FC 640 мм, умовна розкладка ≤1192, hat 38/74/1 мм і розгортка крапельника — кандидати. Уступ 59 мм номінально, 61 мм із 2 мм стрічкою макета. Не прирівнювати геометрію до 76 м²; не замовляти й не монтувати до рішення.

Стан: Відкрите; ревізія, обміри, вентиляція, кріплення й виготовлення не затверджені

Перед серією: точна марка матеріалів, погоджений вузол, випробування основи та приймання прихованих робіт.

Усі наведені RFI відкриті. Див. rfi-register.json для посилань і поточного стану.

ДЛЯ ОБМІРІВ І УЗГОДЖЕННЯ. НЕ ДОЗВІЛ НА РІЗАННЯ ЧИ МОНТАЖ.
